

県営経営体育成基盤整備事業（ほ場）敦賀西部地区 計画平面図

変更説明図（R8 第2回変更）




区分	用途	面積(㎡)	用途別面積(㎡)	用途別面積(㎡)
1	農用地	430	農用地	430
2	農用地	430	農用地	430
3	農用地	430	農用地	430
4	農用地	430	農用地	430
5	農用地	430	農用地	430
6	農用地	430	農用地	430
7	農用地	430	農用地	430
8	農用地	430	農用地	430
9	農用地	430	農用地	430
10	農用地	430	農用地	430
11	農用地	430	農用地	430
12	農用地	430	農用地	430
13	農用地	430	農用地	430
14	農用地	430	農用地	430
15	農用地	430	農用地	430
16	農用地	430	農用地	430
17	農用地	430	農用地	430
18	農用地	430	農用地	430
19	農用地	430	農用地	430
20	農用地	430	農用地	430
21	農用地	430	農用地	430
22	農用地	430	農用地	430
23	農用地	430	農用地	430
24	農用地	430	農用地	430
25	農用地	430	農用地	430
26	農用地	430	農用地	430
27	農用地	430	農用地	430
28	農用地	430	農用地	430
29	農用地	430	農用地	430
30	農用地	430	農用地	430
31	農用地	430	農用地	430
32	農用地	430	農用地	430
33	農用地	430	農用地	430
34	農用地	430	農用地	430
35	農用地	430	農用地	430
36	農用地	430	農用地	430
37	農用地	430	農用地	430
38	農用地	430	農用地	430
39	農用地	430	農用地	430
40	農用地	430	農用地	430
41	農用地	430	農用地	430
42	農用地	430	農用地	430
43	農用地	430	農用地	430
44	農用地	430	農用地	430
45	農用地	430	農用地	430
46	農用地	430	農用地	430
47	農用地	430	農用地	430
48	農用地	430	農用地	430
49	農用地	430	農用地	430
50	農用地	430	農用地	430
51	農用地	430	農用地	430
52	農用地	430	農用地	430
53	農用地	430	農用地	430
54	農用地	430	農用地	430
55	農用地	430	農用地	430
56	農用地	430	農用地	430
57	農用地	430	農用地	430
58	農用地	430	農用地	430
59	農用地	430	農用地	430
60	農用地	430	農用地	430
61	農用地	430	農用地	430
62	農用地	430	農用地	430
63	農用地	430	農用地	430
64	農用地	430	農用地	430
65	農用地	430	農用地	430
66	農用地	430	農用地	430
67	農用地	430	農用地	430
68	農用地	430	農用地	430
69	農用地	430	農用地	430
70	農用地	430	農用地	430
71	農用地	430	農用地	430
72	農用地	430	農用地	430
73	農用地	430	農用地	430
74	農用地	430	農用地	430
75	農用地	430	農用地	430
76	農用地	430	農用地	430
77	農用地	430	農用地	430
78	農用地	430	農用地	430
79	農用地	430	農用地	430
80	農用地	430	農用地	430
81	農用地	430	農用地	430
82	農用地	430	農用地	430
83	農用地	430	農用地	430
84	農用地	430	農用地	430
85	農用地	430	農用地	430
86	農用地	430	農用地	430
87	農用地	430	農用地	430
88	農用地	430	農用地	430
89	農用地	430	農用地	430
90	農用地	430	農用地	430
91	農用地	430	農用地	430
92	農用地	430	農用地	430
93	農用地	430	農用地	430
94	農用地	430	農用地	430
95	農用地	430	農用地	430
96	農用地	430	農用地	430
97	農用地	430	農用地	430
98	農用地	430	農用地	430
99	農用地	430	農用地	430
100	農用地	430	農用地	430

■道路工 【工事】
・軟弱地盤のため、道路盛土量が想定以上に必要になり、土量不足が生じたことによる土量の増
事業量：1.0式
事業費：155,004千円

■整地工 【工事】
・軟弱地盤対策のため、載荷盛土工法を行っていたが、当初想定より圧密沈下が増加し、土量不足が生じたことによる土量の増
事業量：1.0式
事業費：763,653千円

■暗渠排水工 【工事】
・トレンチャー掘削で施工計画をしていたが、一部区域において基盤に石塚が混入しており、トレンチャー掘削での施工が困難であるためバックホウ掘削に変更したことによる増
事業量：1.0式
事業費：223,711千円

標準断面図

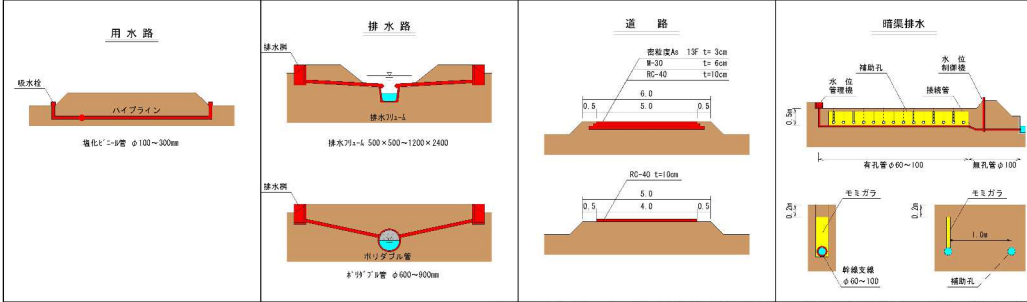

色別	名称	数量
受田	田	142.6ha
益畑	畑	2.0ha
道路(砂利)	道路(砂利)	
道路(As)	道路(As)	
河川	河川	
排水路	排水路	
道路(砂利)	道路(砂利)	
道路(As)	道路(As)	
計	計	
送水管	送水管	
管水路	管水路	
排水路(明水路)	排水路(明水路)	
排水路(管水路)	排水路(管水路)	
客土	客土	102.2ha
暗渠排水	暗渠排水	144.6ha
揚水機場	揚水機場	
ため池	ため池	
非農用地	非農用地	4.0ha

変更理由別採取
事業量変更 増
事業量変更 減
工法変更

